

Beste omwonende,

Met deze nieuwsbrief proberen wij u zo goed mogelijk te informeren over de werkzaamheden die de komende weken uitgevoerd gaan worden bij het Hulstkamp gebouw.

Onderstaande planning is de voorlopige planning. Houd er rekening mee dat deze planning te allen tijde kan veranderen door bijvoorbeeld externe invloeden zoals het weer.

28 FEBRUARI T/M 7 APRIL

In deze periode bestaan de werkzaamheden vooral uit het ontgraven van de bouwkuip en het aanbrengen van het zandcunet. Dit levert veel vrachtverkeer door de straat op.

Na het voltooiën van het zandcunet en het afvoeren van puin en grond gaan wij een werkvloer van beton toepassen. Hiervoor zal de straat op donderdag 2 april en vrijdag 3 april (week 14) afgezet moeten worden.

Verkeershinder: ***

Geluid: **

Uitlaatdamp: *

8 APRIL T/M 28 APRIL

In deze weken gaan wij de boorpalen aanbrengen en dit duurt naar verwachting ongeveer 4 weken. Aan het begin van deze periode wordt de boorstelling aangevoerd, om de palen die het gebouw moeten dragen aan te brengen. Er zal regelmatig aanvoer zijn van stalen buizen.

Op Koningsdag (maandag 27 april) zullen er geen werkzaamheden plaatsvinden.

Verkeershinder: **

Geluid: *

Uitlaatdamp: *

29 APRIL T/M 19 MEI

De keldervloer wordt in deze periode aangebracht. Voor de werkzaamheden zal er regelmatig vrachtverkeer zijn voor de levering van bewapening.

Twee keer per week is er een tijdelijke kraan aanwezig. Op deze momenten zal de Burgemeester Hoffmanstraat gedeeltelijk afgesloten zijn.

Verkeershinder: ***

Geluid: *

Uitlaatdamp *

Overlast indicatie

- **** veel overlast
- *** tijdelijke overlast
- ** geringe overlast
- * weinig tot geen overlast


19 MEI T/M 25 MEI

Op deze dagen wordt de grote torenkraan geleverd en opgebouwd. De gehele periode zal de Burgemeester Hoffmanstraat afgesloten zijn tussen de Thorbeckestraat en de Oeverstraat.

Verkeershinder: ***

Geluid: **

Uitlaatdamp: **

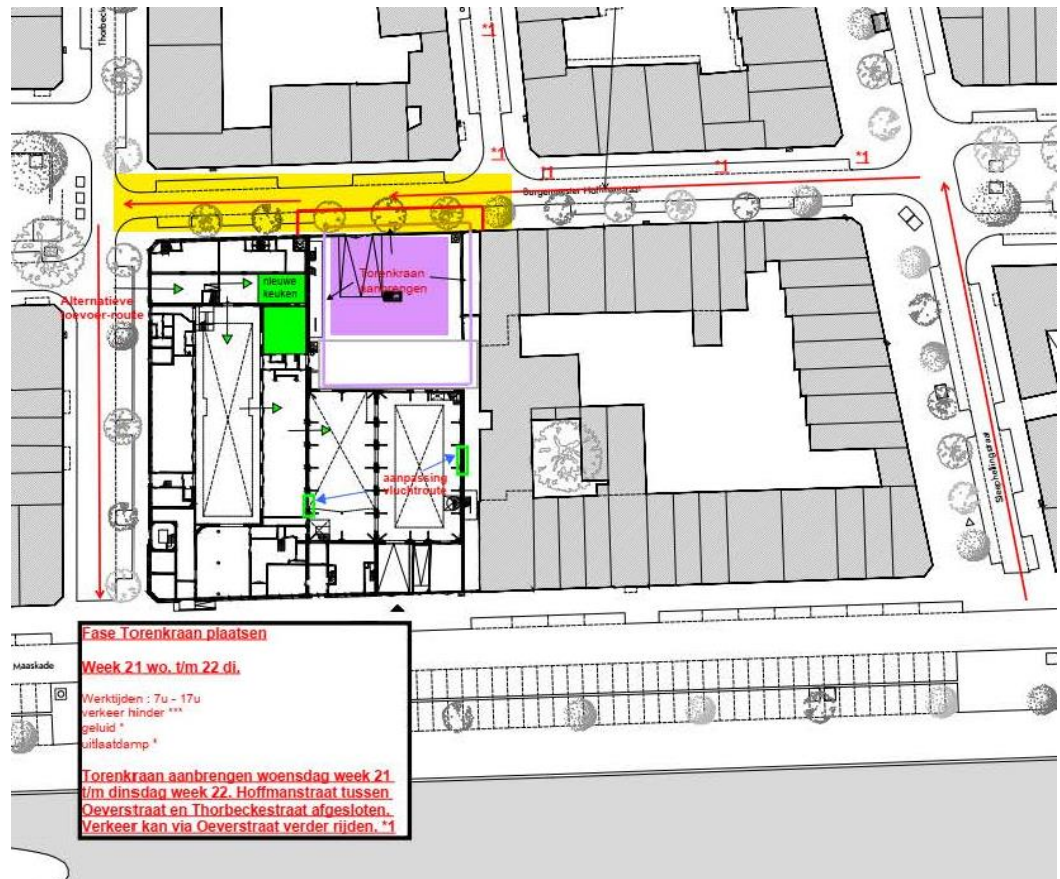

Overlast indicatie

- **** veel overlast
- *** tijdelijke overlast
- ** geringe overlast
- * weinig tot geen overlast
